



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.		
Investor:	Obec Těrlicko	Datum: 20.09.2025	
Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku			
SoD 346/2025/Kch ze dne 27.08.2025			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	Viz. příloha	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Sanace podloží Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace konstrukčních vrstev bylo provedeno celkem 6 SZZ, z toho 2 SZZ byly s nevyhovujícím výsledkem. Viz mapka provedených zkoušek a protokoly. Po dohodě s investorem a TDI byly provedeny sanace v ploše 98m² o mocnosti 400mm.			
Počet připojených listů specifikací : 9		listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Dlažby Mikula s.r.o.			
		 Vojtěch Šebesta	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
TDS doporučuje objednateli předložený návrh SZZ přijmout.			
		 Ing. Andrzej Santarius, Ph.D, MBA	
Stanovisko projektanta stavby:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
Název akce:	Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku	
SoD:	346/2025/Kch ze dne 27.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace podloží Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace konstrukčních vrstev bylo provedeno celkem 6 SZZ, z toho 2 SZZ byly s nevyhovujícím výsledkem. Viz mapka provedených zkoušek a protokoly. Po dohodě s investorem a TDI byly provedeny sanace v ploše 98m² o mocnosti 400mm.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,00 Kč	+ 44 198,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 44 198,00 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegún, starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí	
		
		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DM-25-038 Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko

Objekt: SO 001 Stavební úpravy hřbitova

Rozpočet: 07 Sanace Podloží

Objednatel: Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko

IČO: 297666
DIČ: CZ00297666

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o.
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: 9815210
DIČ: CZ09815210

Vypracoval: Vojtěch Šebesta

Rozpis ceny

Celkem

MNP Celkem			44 198,00
VCP Celkem			0,00
Celkem			44 198,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	44 198,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 281,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

53 479,58 CZK


v Těrlicku

dne

30.9.25



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Sanace podloží	vcp			44 198,00
Cena celkem					44 198,00


Položkový rozpočet

S:	DM-25-035	Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko
O:	002	Sanace podloží - hřbitob
R:	07	Sanace - Hřbitov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				44 198,00
K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	39,20000	273,00	10 701,60
		"pro sanace " (35*2,8*0,4)				
K	764855116.R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 400 mm	m2	98,00000	269,80	26 440,40
K	564871117	Přemístění výkopku v rámci staveniště do 50m	t	70,56000	100,00	7 056,00
		"pro sanace " (35*2,8*0,4)*1,8				

Seznam provedených zkoušek

- 1) 2137/25 - Nelyhovující - Pláň
- 2) 2136/25 - Nelyhovující - Pláň
- 3) 2135/25 - Vyhovující - Pláň
- 4) 2073/25 - Vyhovující - Pláň
- 5) 2072/25 - Vyhovující - Pláň
- 6) 2071/25 - Vyhovující - Pláň

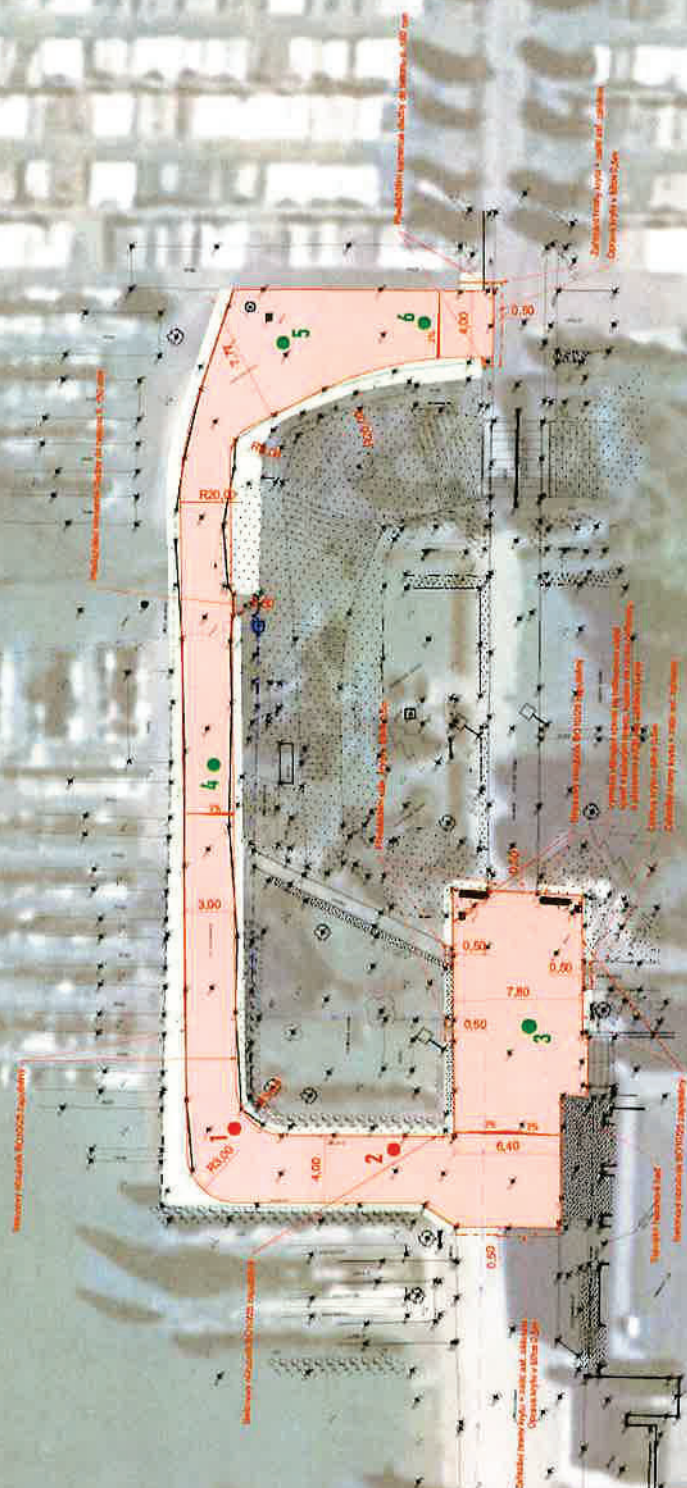



JKV TEST s.r.o.
Technická zkušebna
Holčvkova 164/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky



Zkušební laboratoř č. 1294
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1294

Datum: 09.09.2025
List č.: 1/1
Výtisk č.: 1/2


Protokol č. 2137 /25

O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Zk. č. 12 / ČSN 72 1006
příloha A

Objednatel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Stavba: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlícku
Místo zkoušky: stavba, Těrlícko
Objekt: zkouška č. 6, viz plánek stavby
Klimatické podmínky: jasno 20 °C
Datum a čas zkoušky: 09.09.2025 13:00 hod.
Průměr zatěžovací desky: 300 mm
Zkušební zařízení: zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM-STATIC / M
Popis zkoušené vrstvy: pláň - původní materiál
zemina + struska 0-32 mm

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontakt. napětí p v MPa	Zatlačení desky y v mm
1	První zatěžov. cyklus	0,00	0,00
2		0,05	0,62
3		0,10	0,94
4		0,15	1,50
5		0,20	2,50
6		0,25	3,22
7		0,30	4,18
8	Odlehčení	0,15	3,72
9		0,07	3,20
10		0,00	1,98
11	Druhý zatěžov. cyklus	0,00	1,98
12		0,04	2,16
13		0,08	2,40
14		0,12	2,80
15		0,16	3,20
16		0,20	3,60
17		0,25	4,06

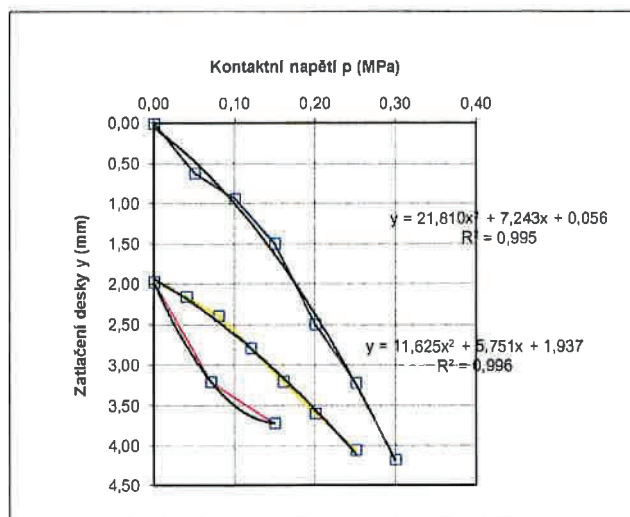

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
p_{max}	MPa	0,300	0,250
a_1	mm.MPa ⁻¹	7,243	5,751
a_2	mm.MPa ⁻²	21,810	11,625
E_{def}	MPa	16	26
E_{def2}/E_{def1}	-	1,59	

Zkoušku provedl:
Marek Wlaczka



Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

KONEC PROTOKOLU

Ing. Jiří Kubík
vedoucí zkušební laboratoře
JKV TEST s.r.o.



JKV TEST s.r.o.
Technická zkušebna
Holčvkova 164/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky



Zkušební laboratoř č. 1294
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1294

Protokol č. 2136 /25


Datum: 09.09.2025
List č.: 1/1
Výtisk č.: 1/2

O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Zk. č. 12 / ČSN 72 1006
příloha A

Objednatel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Stavba: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlícku
Místo zkoušky: stavba, Těrlícko
Objekt: zkouška č. 4, viz plánek stavby
Klimatické podmínky: jasno 20 °C
Datum a čas zkoušky: 09.09.2025 12:30 hod.
Průměr zatěžovací desky: 300 mm
Zkušební zařízení: zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM-STATIC / M
Popis zkoušené vrstvy: pláň - původní materiál
zemina + struska 0-32 mm

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontakt. napětí p v MPa	Zatlačení desky y v mm
1	První zatěžov. cyklus	0,00	0,00
2		0,05	0,20
3		0,10	0,62
4		0,15	1,34
5		0,20	1,72
6		0,25	2,52
7		0,30	3,54
8	Odlehčení	0,15	3,20
9		0,07	2,62
10		0,00	1,32
11	Druhý zatěžov. cyklus	0,00	1,32
12		0,04	1,52
13		0,08	1,74
14		0,12	2,00
15		0,16	2,40
16		0,20	2,88
17		0,25	3,48

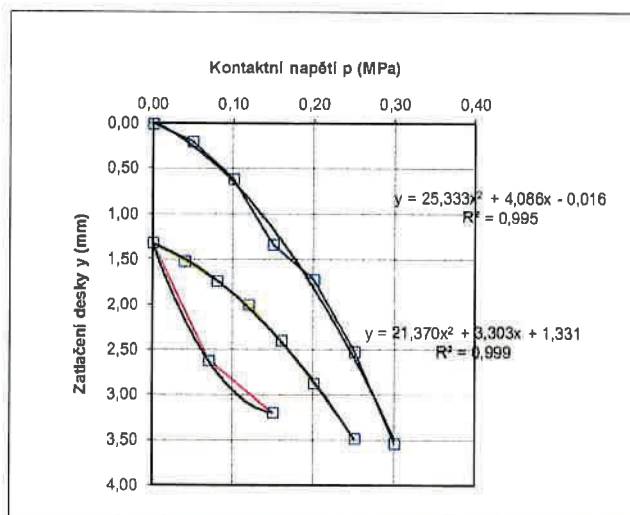

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
p_{max}	MPa	0,300	0,250
a_1	mm.MPa ⁻¹	4,086	3,303
a_2	mm.MPa ⁻²	25,333	21,370
E_{def}	MPa	19	26
E_{def2}/E_{def1}	-	1,35	

Zkoušku provedl:
Marek Wiaczka



Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý

KONEC PROTOKOLU

Ing. Jiří Kubík
vedoucí zkušební laboratoře
JKV TEST s.r.o.



JKV TEST s.r.o.
Technická zkušebna
Holčvkova 164/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Zkušební laboratoř č. 1294
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



L 1294

Datum: 09.09.2025
List č.: 1/1
Výtisk č.: 1/2


Protokol č. 2135 /25

O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Zk. č. 12 / ČSN 72 1006
příloha A

Objednatel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Stavba: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku
Místo zkoušky: stavba, Těrlicko
Objekt: zkouška č. 6, viz plánek stavby
Klimatické podmínky: jasno 20 °C
Datum a čas zkoušky: 09.09.2025 12:00 hod.
Průměr zatěžovací desky: 300 mm
Zkušební zařízení: zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM-STATIC / M
Popis zkoušené vrstvy: pláň - původní materiál
struska 0-32 mm

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontakt. napětí p v MPa	Zatlačení desky y v mm
1	První zatěžov. cyklus	0,00	0,00
2		0,05	0,18
3		0,15	0,56
4		0,20	0,80
5		0,30	1,24
6		0,45	2,12
7	Odlehčení	0,50	2,46
8		0,25	2,40
9		0,12	2,22
10	Druhý zatěžov. cyklus	0,00	1,26
11		0,00	1,26
12		0,05	1,32
13		0,15	1,50
14		0,20	1,64
15		0,30	1,82
16		0,40	2,16
17		0,45	2,48

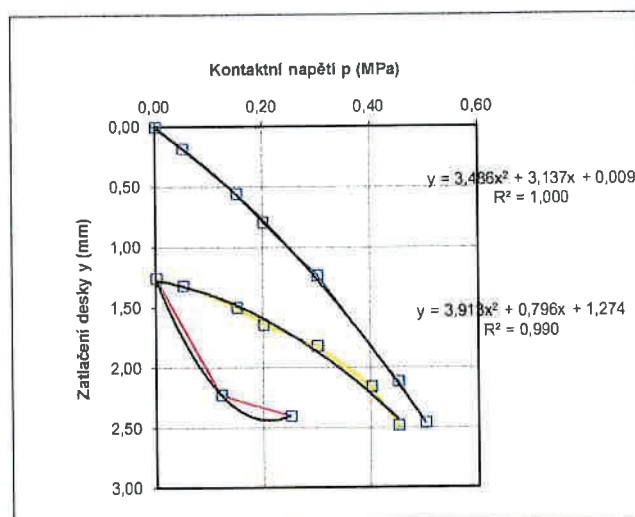

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
p_{max}	MPa	0,500	0,450
a_1	mm.MPa ⁻¹	3,137	0,796
a_2	mm.MPa ⁻²	3,486	3,913
E_{def}	MPa	46	88
E_{def2}/E_{def1}	-	1,91	

Zkoušku provedl:
Marek Wiaczka,

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý

KONEC PROTOKOLU



Ing. Jiří Kubík
vedoucí zkušební laboratoře
JKV TEST s.r.o.



JKV TEST s.r.o.
Technická zkušebna
Holčokova 164/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky



Zkušební laboratoř č. 1294
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1294

Protokol č. 2073 /25


Datum: 03.09.2025
List č.: 1/1
Výtisk č.: 1/2

O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Zk. č. 12 / ČSN 72 1006
příloha A

Objednatel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Stavba: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku
Místo zkoušky: stavba, Těrlícko
Objekt: zkouška č. 3, viz plánek stavby
Klimatické podmínky: polojasno 20 °C
Datum a čas zkoušky: 03.09.2025 13:30 hod.
Průměr zatěžovací desky: 300 mm
Zkušební zařízení: zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM-STATIC / M
Popis zkoušené vrstvy: pláň - původní materiál
struska 4-8 mm

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontakt. napětí p v MPa	Zatlačení desky y v mm
1	První zatěžov. cyklus	0,00	0,00
2		0,05	0,16
3		0,15	0,72
4		0,20	0,98
5		0,30	2,02
6		0,45	4,26
7		0,50	4,78
8	Odlehčení	0,25	4,68
9		0,12	4,38
10		0,00	2,64
11	Druhý zatěžov. cyklus	0,00	2,64
12		0,05	2,82
13		0,15	3,26
14		0,20	3,50
15		0,30	3,92
16		0,40	4,50
17		0,45	4,82

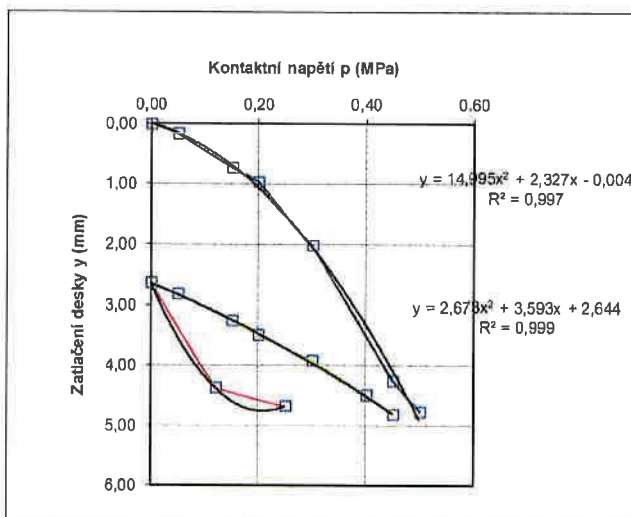

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
p_{max}	MPa	0,500	0,450
a_1	mm.MPa ⁻¹	2,327	3,593
a_2	mm.MPa ⁻²	14,995	2,673
E_{def}	MPa	23	47
E_{def2}/E_{def1}	-	2,05	

Zkoušku provedl:
Marek Wiaczka

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

KONEC PROTOKOLU



Ing. Jiří Kubík
vedoucí zkušební laboratoře
JKV TEST s.r.o.



JKV TEST s.r.o.
Technická zkušebna
Holčvkova 164/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky



Zkušební laboratoř č. 1294
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Datum: 03.09.2025
List č.: 1/1
Výtisk č.: 1/2


Protokol č. 2072 /25

O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Zk. č. 12 / ČSN 72 1006
příloha A

Objednatel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Stavba: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku
Místo zkoušky: stavba, Těrlicko
Objekt: zkouška č. 2, viz plánec stavby
Klimatické podmínky: polojasno 20 °C
Datum a čas zkoušky: 03.09.2025 13:00 hod.
Průměr zatěžovací desky: 300 mm
Zkušební zařízení: zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM-STATIC / M
Popis zkoušené vrstvy: pláň - původní materiál
struska 4-8 mm

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontakt. napětí p v MPa	Zatlačení desky y v mm
1	První zatěžov. cyklus	0,00	0,00
2		0,05	0,22
3		0,15	0,78
4		0,20	1,08
5		0,30	2,12
6		0,45	3,86
7		0,50	4,32
8	Odlehčení	0,25	4,20
9		0,12	3,92
10		0,00	2,18
11	Druhý zatěžov. cyklus	0,00	2,18
12		0,05	2,32
13		0,15	2,64
14		0,20	2,90
15		0,30	3,32
16		0,40	3,98
17		0,45	4,42

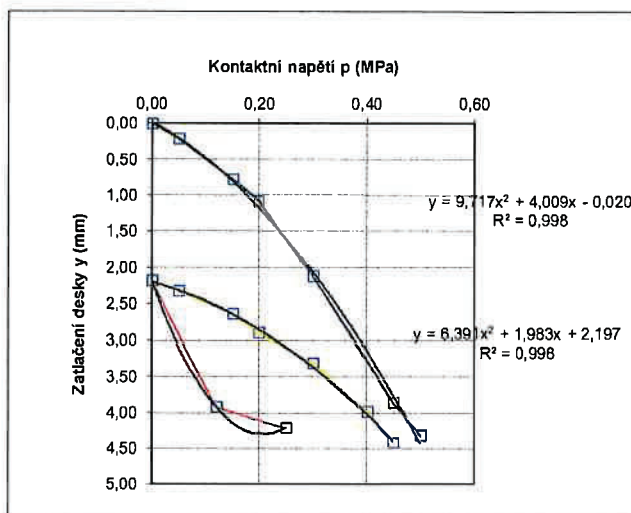

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
p_{max}	MPa	0,500	0,450
a_1	mm.MPa ⁻¹	4,009	1,983
a_2	mm.MPa ⁻²	9,717	6,391
E_{def}	MPa	25	46
E_{def2}/E_{def1}	-	1,82	

Zkoušku provedl:
Marek Wiaczka



Ing. Jiří Kubík
vedoucí zkušební laboratoře
JKV TEST s.r.o.

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

KONEC PROTOKOLU



JKV TEST s.r.o.
Technická zkušebna
Holčvkova 164/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky



Zkušební laboratoř č. 1294
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1294

Protokol č. 2071 /25


Datum: 03.09.2025
List č.: 1/1
Výtisk č.: 1/2

O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Zk. č. 12 / ČSN 72 1006
příloha A

Objednatel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Stavba: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku
Místo zkoušky: stavba, Těrlicko
Objekt: zkouška č. 1, viz plánec stavby
Klimatické podmínky: polojasno 20 °C
Datum a čas zkoušky: 03.09.2025 12:30 hod.
Průměr zatěžovací desky: 300 mm
Zkušební zařízení: zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM-STATIC / M
Popis zkoušené vrstvy: pláň - původní materiál
struska 0-32 mm

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontakt. napětí p v MPa	Zatlačení desky y v mm
1	První zatěžov. cyklus	0,00	0,00
2		0,05	0,18
3		0,15	0,92
4		0,20	1,44
5		0,30	2,56
6		0,45	4,94
7	Odlehčení	0,50	5,72
8		0,25	5,68
9		0,12	5,32
10	Druhý zatěžov. cyklus	0,00	3,20
11		0,00	3,20
12		0,05	3,40
13		0,15	3,82
14		0,20	4,10
15		0,30	4,74
16		0,40	5,38
17		0,45	5,80

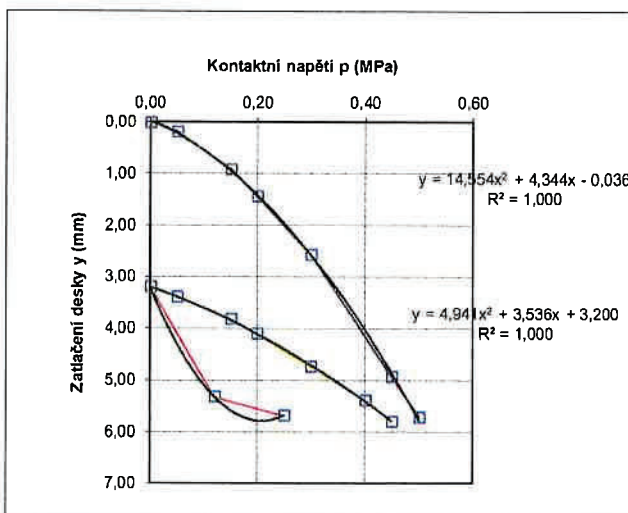

Výsledky zkoušky

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
p_{max}	MPa	0,500	0,450
a_1	mm.MPa ⁻¹	4,344	3,536
a_2	mm.MPa ⁻²	14,554	4,941
E_{def}	MPa	19	39
E_{def2}/E_{def1}	-	2,02	

Zkoušku provedl:
Marek Wiaczka



Ing. Jiří Kubík
vedoucí zkušební laboratoře
JKV TEST s.r.o.

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

KONEC PROTOKOLU
