

Změna 06

neuznatelné náklady

Změnový list ZL6 – změna provedení přípojky k RD čp.95

Akce:

„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“

Předkladatel – zhotovitel:

TOMireko,s.r.o.

Karlovo nám.48

674 01 Třebíč

Datum: 10.6. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dvořák


TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace bylo zjištěno, že přípojku lze realizovat jako gravitační

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD

2.2. Nové řešení

Na základě zjištění v průběhu realizace byla přípojka k RD čp. 95 realizována, obdobně jako ostatní přípojky, jako gravitační – viz. příloha 2.

2.3. Cenové porovnání

Přípojka byla realizována stejně jako ostatní přípojky z KG 200PP DN 150 vč. koncové plastové revizní šachty WAVIN DN 315. Původní výtlačková přípojka vč. ČS je odečtena. Cena díla se poníží o 30.060,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 10.6.2022

Podpis:



T.OMírsko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vítězslav Prusa

Datum:

Podpis:




4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

č. 2: výkres změny

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
Objekt:	01	Splašková kanalizace
Rozpočet:	03	Změna provedení přípojky k č.p.95 - ZL 6

Objednatel:	IČO: 00290297
Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 28359216
TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-30 060
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			-30 060

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 060 CZK
Základní DPH	21 %	-6 313 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

Cena celkem s DPH	-36 373 CZK
--------------------------	--------------------

v

Třebíč



Za zhotovitele

dne

17.2.2023

OBEC RADKOVICE
675 59 Radkovice u Hrotovic 13
IČ: 00290297 tel.: 568 864 427
č. účtu: 6229711/0100 ①
e-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-30 060	100
Cena celkem					-30 060	100

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	03	Změna provedení přípojky k č.p.95 - ZL 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-30 060,00
1	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin vč. dodávky	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00
2	8.01 - 8.03	Čerpací stanice - dodávka + osazení pouze domovní ČŠ u čp. 95	kpl.	-1,00000	74 000,00	-74 000,00
3	831230110RAB	Kanalizační přípojka z trub polyetylénových D 40 - výtlačková část	m	-48,90000	1 040,00	-50 856,00
4	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m	m	48,90000	1 840,00	89 976,00

DOMOVNI ČÍS ZRUŠENÁ
UKAČOVÁ PLOŠTŤOV ŠACHTOV KANALU DÚ 315

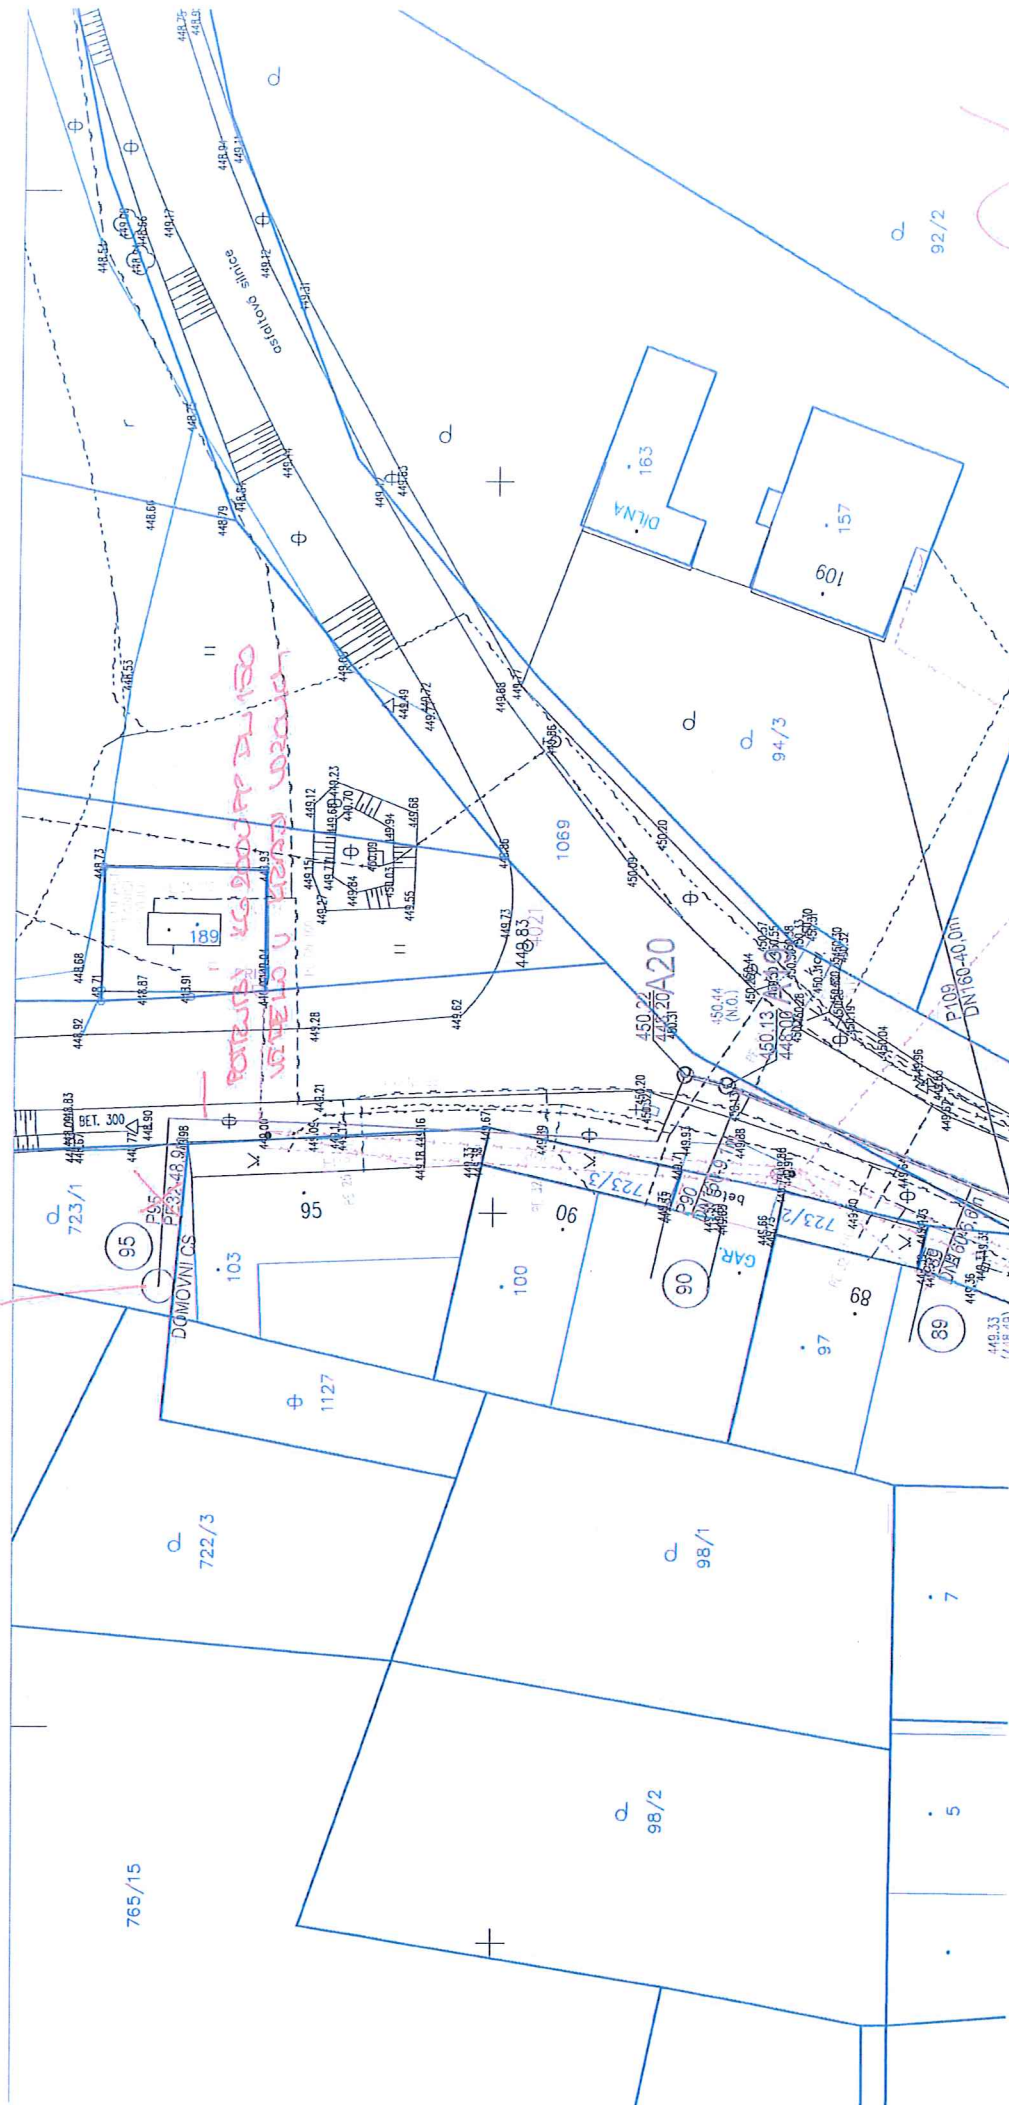

POTRUBÍ KG 200 PP DÚ 150
VÝSTUP V KANALU DÚ 315



Karlova nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
