



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 174 / LCIV / 2017

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**
Sídlo: Chodov, Školní 737, PSČ 35735
Zastoupen: Bc. Věrou Bráborcovou, ředitelkou
IČ: 27989364
DIČ: CZ27989364

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 111.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4034492339/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Milan Kaláb
- koordinátor BOZP: Jiří Hioka

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **SUAS - stavební, s.r.o.**
Sídlo: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 35601
Kontaktní místo: 357 43 Vřesová, Areál Sokolovské uhelné
Zastoupen: Pavlem Mikešem - jednatelem
IČ: 617 79 539
DIČ: CZ61779539
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17521443/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Libor Vrána

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18. 12. 2017 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP s názvem projektu: „Zřízení denního stacionáře v Sokolově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611 (dále jen jako „**projekt**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 2, 7 a 8 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnové listy stavby č. 16, 21 a 22. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 3, 5 a 6 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnové listy stavby č. 17, 19 a 20. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 4 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č. 18. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č. 15. Jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací, přičemž nové položky stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a cena položek se nemění.

2.6. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD a dodatků č. 1, 2 a 3			14 854 010,61	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 15	222/7	Méněpráce	- 130 725,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	130 725,00	Kč bez DPH

Změnový list stavby č. 16	222/4	Méněpráce	- 179 445,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	207 500,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 17	222/5	Méněpráce	- 24 234,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	44 579,92	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 18	222/6	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	8 136,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 19	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	12 148,70	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 20	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	8 148,28	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 21	222/4	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	4 188,90	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 22	222/4	Méněpráce	- 11 119,50	Kč bez DPH
		Vícepráce	53 808,86	Kč bez DPH
Cena díle podle dodatku č. 4			14 977 722,77	Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 - 8 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 - 8.

IV. Přílohy dodatku

- Příloha č. 1:** – Změnový list č. 15
Příloha č. 2: – Změnový list č. 16
Příloha č. 3: – Změnový list č. 17
Příloha č. 4: – Změnový list č. 18
Příloha č. 5: – Změnový list č. 19
Příloha č. 6: – Změnový list č. 20
Příloha č. 7: – Změnový list č. 21
Příloha č. 8: – Změnový list č. 22

V Chodově dne 30. 5. 2018
DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
iČ: 279 89 774, Tel.: 352 665 992

Bc. Věra Bráborcová
ředitelka


SUAS stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2 ⑤

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Pavel Mikeš
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: 15

Název projektu: **Zřízení denního stacionáře v Sokolově**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611**

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**
Chodov 357 35, Školní 737
IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364

Zhotovitel: **SUAS-stavební, s.r.o.**
Sokolov 356 01, Jednoty 1628
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově

STRUČNÝ POPIS: Dle požadavku objednatele, zástupce PK a TDi na změnu provedení vnitřního zábradlí z nerezového materiálu - nosné sloupky kulatého profilu se svislou prutovou výplní a dřevěným madlem náhradou za navržené a oceněné v rozpočtu k SoD z ocelových trubek práškově lakovaných, provedl zhotovitel poptávku nového řešení a cenové relace. **Návrh nové konstrukce zábradlí:** nerezové zábradlí kulaté s bukovým madlem Ø 42,4 mm, kotvení boční kulatá velká patka, výplň nerezové svislé pruty Ø 10 mm, na stěnách madla buková Ø 42,4 mm, kotvená na nerez krčky. Výroba, dodávka a montáž dle stavebnicového systému komponentů společnosti **J.A.P. Přerov**. Povrchová úprava je kartáčovaná nerez.

Ocenění - změn typu provedení a použitého materiálu VNITŘNÍHO ZABRADLÍ SCHODIŠTĚ

Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položka ze soupisu prací a dodávek k SoD						
1.	76701	Zábradlí práškově lakované trubkové schodišťové odpovídající obecně záv.předpisům D+M, v.1000 mm	m	24,90	-5 250,00	-130 725,00
Nová nahrazující položka						
2.	767001	Nerez zábradlí dle popisu - zakázková výroba	soub	1,00	96 749,00	96 749,00
3.	767002	Montáž z komponentů včetně dopravy na místo stavby	soub	1,00	33 976,00	33 976,00
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 15 bez DPH						0,00 Kč
DPH 21 %						0,00
Cena celkem včetně DPH						0,00 Kč

V Sokolově dne 25.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel. 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:


DENNÍ CENTRUM ③

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 685 992

Technický dozor investora: Ing. Milan Kaláb

Vzorové foto provedení:

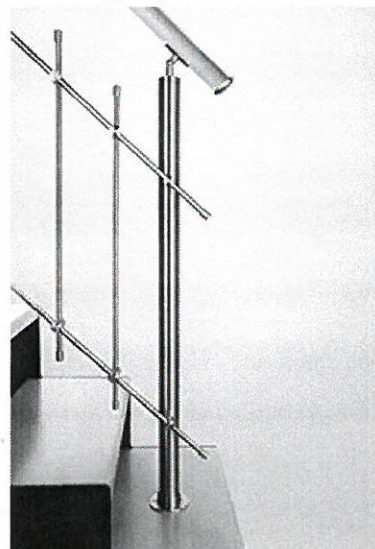

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	16	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: Dle podkladů objednatele na požadovanou výbavu a technické parametry celotělové vany pro vířivou a perličkovou masáž a chronometrii a s jeho dobrými zkušenostmi s výrobcem a dodavatelem společností MADISSON s.r.o. byla poptána a bude dodávána včetně montáže vana s označením Aquadelicia mini III L. Těmito specifickými požadavky objednatele a výběrem dodavatele došlo k navýšení za výrobu a dodávku včetně montáže uvedeného zařízení provozu denního stacionáře.						
Ocenění - navýšení ceny za dodávku vč. montáže hydromasážní vany dle požadavku objednatele						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
<i>Položka ze soupisu prací a dodávek k SoD</i>						
60	725220001	Vodoléčebná hydromasážní vana vč. příslušenství	kus	1,00	-179 445,00	-179 445,00
<i>Nová nahrazující položka</i>						
1.	725220001 N	Celotělová vana AQUADELICIA MINI III L dle požadavku	kus	1,00	207 500,00	207 500,00
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 16 bez DPH						28 055,00 Kč
DPH 21 %						5 891,55
Cena celkem včetně DPH						33 946,55 Kč

V Sokolově dne 28.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.** ③

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364, tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

Kaláb

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	17	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny neuvedením rozměru v PD a chybně zadaným rozměrem (hloubkou) při vyhotovení výkazu výměr a rozpočtu pro zadávací řízení. Dodatečné stavební práce - nejsou v původních zadávacích podmínkách uvedeny v potřebném rozsahu (rozměr - hloubka sklepního světlíku dle skutečnosti - o 80 cm více) a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a objekt provozuschopný.						
Ocenění - navýšení ceny za dodávku vč.montáže sklepních světlíků z plastu a roštu z tahokovu						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položka ze soupisu prací a dodávek k SoD						
45	328151111R00	Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt	kus	4,00	-1 050,00	-4 200,00
56	553508879	Sklepní světlík např.ACO Albroud pochozí, 1 250 x 1 000 x 400 mm, tahokov	kus	4,00	-5 008,50	-20 034,00
Nová nahrazující položka						
1.	328151111R00	Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt	kus	4,00	1 050,00	4 200,00
2.	328151115R00	Montáž nastavovacího prvku sklepního světlíku 350 mm	kus	8,00	504,74	4 037,92
3.	865536	Sklepní světlík MEA MULTINORM 125 x 100 x 40 cm, tahokov	kus	4,00	5 008,50	20 034,00
4.	865847	Nastavovací prvek MEA sklepního světlíku 35 cm, plast	kus	8,00	2 038,50	16 308,00
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 17 bez DPH						20 345,92 Kč
DPH 21 %						4 272,64
Cena celkem včetně DPH						24 618,56 Kč

V Sokolově dne 28.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.	DENNÍ CENTRUM	③
	MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.	
	Školní 737, 357 35 Chodov	
	IČ: 279 89 364, tel.: 352 665 992	

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

[Handwritten signature]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	18	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za opravu stávajících hřebenů střešní betonové krytiny je z důvodu větší mezery v hřebenové části střechy, kterou nelze zakrýt standardním způsobem. A proto je třeba řešit zakrýt větší mezery dvěma hřebenovými větracími pásy položenými rovnoběžně částečně přes sebe. Dodatečné stavební práce nejsou v původních zadávacích podmínkách uvedeny v potřebném rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností po demontáži stávajících konstrukcí hřebenové části střechy a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.						
Ocenění - navýšení ceny za opravu stávajících hřebenů střešní betonové krytiny						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	765121251.U00	Montáž větracího pásu hřebene	m	42,00	63,40	2 662,80
2.	592-44142	Dodávka větracího pásu hřebene	kus	42,00	134,60	5 653,20
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 18 bez DPH					8 316,00 Kč	
DPH 21 %					1 746,36	
Cena celkem včetně DPH					10 062,36 Kč	

V Sokolově dne 29.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.** **DENNÍ CENTRUM** ③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

Kaláb

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	19	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za dodávku a montáž světlovodů VELUX TWR 014 o prodloužení tubusů v celkové délce 11,16 metrů je z důvodu změny situování světlovodů ve střešní konstrukci oproti zpracované projektové dokumentaci. Původní kratší umístění není vhodné z důvodu orientace na severní stranu. Nově budou světlovody situovány do ploch střechy směrem na jižní stranu. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku nedostatku v zaměření skutečného stavu objektu a ve vypracování projektové dokumentace předložené v zadávacím řízení. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno nefunkčností navržených komponentů.						
Ocenění - navýšení ceny - prodloužení tubusů světlovodů VELUX TWR 014						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	611-40596	Dodávka prodloužení VELUX (S) ZTR OK14 014	kus	4,00	2 849,00	11 396,00
2.	767330122.U00	Mtž.prodloužení světlovod tubus D - 350 mm	m	3,90	193,00	752,70
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 19 bez DPH					12 148,70 Kč	
DPH 21 %					2 551,23	
Cena celkem včetně DPH					14 699,93 Kč	

V Sokolově dne 29.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.	DENNÍ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s. ③
	Školní 737, 357 35 Chodov
	IČ: 279 89 364 TEL: 352 865 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	20
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za nutnou výměnu stářím poškozených a nefunkčních klempířských prvků - okapních žlabů a dešťových svodů Po kontrole stavu těchto částí střešní konstrukce, při zahájení pokrývačských a klempířských prací, byl stanoven skutečný rozsah potřebné výměny okapních žlabů a svodů oproti plánované výměně při zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr v rozpočtu pro zadávací řízení. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku zjišťování stavu klempířských konstrukcí v čase před dokončením projektové dokumentace a výkazu výměr rozpočtu, ale dalším působením povětrnostních vlivů se zhoršil stav těchto konstrukcí pro nutnou výměnu ve větším rozsahu. Tyto dodatečné práce je možno klasifikovat jako nepředvídatelně vzniklé s postupem času. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno nefunkčností celého systému odvodu dešťové vody.							
Ocenění - navýšení ceny za větší rozsah výměny nefunkčních okapních žlabů a dešťových svodů							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
203	764252614R00	Žlaby z titanzinkového plechu Žlab podokapní půlkul.TiZn rš. 333, vč háků	m	7,00	481,90	3 373,30	
206	764551603R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu Svod z TiZn, kruhový, D 100 mm	m	10,00	419,51	4 195,10	
207	764551613R00	Odpadní trouby z titanzin.plechu Koleno z TiZn 72°, kruhové, D 100 mm	kus	4,00	153,97	615,88	
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 20 bez DPH						8 184,28 Kč	
DPH 21 %						1 718,70	
Cena celkem včetně DPH						9 902,98 Kč	

V Sokolově dne 30.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364, Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

Ing. Milan KAČÁK - Projektová a inžinierska kancelária, Mikulčanova 1148, 356 01 Sokolov IČ: 174 03 744 DIČ: CZ3504120677 Číslo autorizácie: 0000295 Tel. 777 530 012 e-mail: mika@mkajaky.sk		Povše Selo	
Projektant	Michaela Dergierová		
Zodpovedný projektant	Ing. Milan Kačák		
Stavovateľ			
Denní centrum Matefídouška, o. p. s. Školní 737, 357 35 Chodov			
Stavba	Datum: 05/2015		
Denní stacionár - Sokolov, Sokolovská 1508		Účel	DSP
Friedmál	POHLED NA STŘECHU	Měřítko:	1 : 100
		Průběh čísel:	D.1.1-11

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	21	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - na základě požadavku objednatele z důvodu usnadnění a zkvalitnění údržby zatravněných ploch pozemku a další zeleně a k případným provozním účelům zařízení stacionáře Zástupci zhotovitele požadují dodávku a osazení nezámrazného zahradního ventilu na severní vnější stěnu objektu denního stacionáře. Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou zpracované v projektové dokumentaci a ani obsaženy v zadávacích podmínkách a ve zpracovaném výkazu výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je požadavek objednatele k doplnění provozního zařízení budovy.						
Ocenění - dodávky a montáže zahradního nezámrazného ventilu včetně přívodního potrubí PPR						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	7221701	Nezámrazný ventil Meibes	kus	1,00	2 242,50	2 242,50
2.	7221702	Kulový ventil 20 - k nezámraznému ventilu	kus	1,00	221,25	221,25
29	722174024.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR 20	m	5,00	240,45	1 202,25
36	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl.do 25 mm DN do 22 mm	m	5,00	104,58	522,90
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 21 bez DPH						4 188,90 Kč
DPH 21 %						879,67
Cena celkem včetně DPH						5 068,57 Kč

V Sokolově dne 30.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

DENNÍ CENTRUM
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY					Číslo:	22
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - na základě požadavku objednatele z důvodu rozšíření nabídky služeb denního stacionáře také pro dětské klienty Zástupci zhotovitele požadují dodávku a osazení dětského závěsného klozetu a umyvadla pro děti s tlačnou umyvadlovou stojánkovou baterií. Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou zpracované v projektové dokumentaci a ani obsaženy v zadávacích podmínkách a ve zpracovaném výkazu výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je požadavek objednatele k doplnění vybavení provozu pro možnost nabídnout své služby také dětské klientele.						
Ocenění - víceprací a méněprací zdravotnických provedených dle požadavku objednatele						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40 (k umyvadlu v m.č.1-09)	m	6,00	275,46	1 652,76
29	722174022.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	6,00	240,45	1 442,70
2.	7259998	Oddálené tlačítko pro WC	kus	2,00	2 205,00	4 410,00
3.	725112022	Klozet keramický závěsný dětský na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný + prkýnko	soub	1,00	5 390,00	5 390,00
57	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon (do místn.č. 1-09)	kus	1,00	2 089,50	2 089,50
4.	725211603	Umyvadlo keramické dětské	kus	1,00	1 160,50	1 160,50
82	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti (k umyv. v m.č. 1-09)	kus	1,00	1 386,00	1 386,00
5.	725822612	Baterie umyvadlová stojánková tlačná Shell (k dětskému umyvadlu) + k dalším 4 umyvadlům dle požadavku objednatele	kus	5,00	4 180,00	20 900,00
6.	725822651	Ventil směšovací River R 284	kus	2,00	3 296,70	6 593,40
7.	725865501	Přečerpávací stanice (k umyvadlu v místn.č. 1-09)	kus	1,00	8 784,00	8 784,00
Odpočet položek ze soupisu prací a dodávek k SoD						
55	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,00	-2 100,00	-2 100,00
57	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon (místo něj umyvadlo dětské)	kus	1,00	-2 089,50	-2 089,50
82	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus	5,00	-1 386,00	-6 930,00
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 22 bez DPH						42 689,36 Kč
DPH 21 %						8 964,77
Cena celkem včetně DPH						51 654,13 Kč

V Sokolově dne 30.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364, Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**
